まちづくり交付金 事後評価シート 前橋市六供地区

平成20年12月


群馬県前橋市

様式2-1 評価結果のまとめ


都道府県名	群馬県		市町村名前橋市			1	也区名		六供地区				面積	167.4ha			
交付期間	平成16年~平成20年		事後評価	実施時期			交付対象事業費		3,395百万 国費率			率	0.4				
			事業名														
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、	基幹事業	高質空間形成施設、土地区画整理事業(六供地区)														
	実施した事業	提案事業	なし なし control to the control to th														
		1	事業名						削除/追加の理由				削除/追加による目標、指標、数値目標への影響				
	当初計画から	基幹事業	なし														
	削除した 事業	提案事業	なし														
	新たに追加した事業	基幹事業	なし														
		提案事業	大学管理講義棟等整備事業						地域コミュニティの活性化等				都市再生整備計画に目標2項目追加				
	交付期間	知间 一 1/3			戊20年		交付期間の変更による事業、										
	の変更 変 更			-		指標、数値目標への影響											
2)都市再生整備計画 に記載した目標を 定量化する指標 の達成状況		指 標		単位	従前(値 基準年度	目標化	直 目標年度	数 モニタリング	値 評価値	_ 目標 達成度	1年以 達成見		効果発現要 (総合所見	<u>(</u>)	フォローアップ 予定時期	
	指標1	地域内住居者数の増加率		人/ha	67	H16	77	H20		76	Δ	あり なし		土地区画整理事業の進捗 整備され、分譲地やアパー 築された。	に伴い街並みが -トなどが多く建	平成21年4月頃	
	指標2	指標2 消防活動困難度			20.4	H16	8.1	H20		9.1	Δ	ありなし		土地区画整理事業の進捗 整備され消防車等の通行1 所が減った。 また公園の整備や大学管3 により緊急避難所機能が到	こ支障がある場 理講義棟の完成	平成21年4月頃	
	指標3	標3 商業店舗床面積		m [‡]	11,880	H16	13,068	H20	<u></u>	12,700	Δ	あり なし		土地区画整理事業の進捗整備され、幹線道路沿いな		平成21年4月頃	
	指標4	票4 公開講座(市民講座)の 施		回	8	H17	24	H20		14	Δ	あり なし	•	講義棟で公開講座を実施し ティーの活性化に繋がった		平成21年4月頃	
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況		指 標	単位		従前			直 目標年度	数 モニタリング	値 評価値	目標 達成度※1	1年以内の 達成見込み		効果発現要 (総合所見		フォローアップ 予定時期	
	その他の数値指標1			<u> </u>		<u> </u>				11 JM JE				(10)		170.77	
	その他の												_				
4)定性的な効果 発現状況	なし			1						ı							
5)実施過程の評価			実施内容						実施状況				今後の対応方針等				
	モニタリ	都市再生 なし 都市再生					都市再生整	を備計画に記載し、実施できた を備計画に記載はなかったが、実施した を備計画に記載したが、実施できなかった									
	住民参 プロセ	園の1カ所の施設整備について地元と十分な協議を重ね整備を都市再生行う。 都市再生						整備計画に記載したが、実施できなかった				公園愛	国愛護会の活動				
	持続的なま 体制の		公園愛護会の設置都市再生						を備計画に記載し、実施できた を備計画に記載はなかったが、実施した を備計画に記載したが、実施できなかった ●				会設置が固まれば公園管理事務所にて認可をする。				

様式2-2 地区の概要


六供地区(群馬県前橋市) まちづくり交付金の成果概要 まちづくりの日標 目標を定量化する指標 従前値 日標値 評価値 67 H16 地域内住居者数の増加率 単位:人/ha 77 H20 76 H20 地域と人の基盤整備による健全で安全な新しいまちづくり 9.1 H20 単位:% 20.4 H16 8.1 H20 消防活動困難度 目標1 区画整理事業や六供地区近隣公園整備の地域基盤整備により、交通混雑の緩和や良好な住環境の形成 単位 : m² を図る、安全で健全なまちづくり 11.880 H16 13.068 H20 12.700 H20 商業店舗床面積 目標2 大学を中心に学生と地域住民が一体となった地域コミュニティの形成と新たなまちづくりの担い手の育成 公開講座(市民講座)の実施 単位:回 8 H17 24 H20 14 H20 目標3 大学施設を防災施設として活用したまちの防災安全機能強化





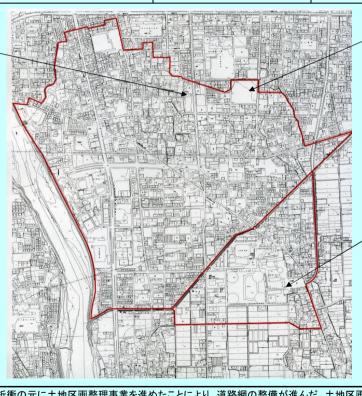

基幹事業(高質空間形成事業) ·六供天神公園



提案事業(地域創造支援事業) ·大学管理講義棟等整備事業



幅員狭小道路の改善・・・地域住民との十分な折衝の元に土地区画整理事業を進めたことにより、道路網の整備が進んだ。土地区画整理事業は継続中のため、引き続き整備を進めていく。 <mark>まちの課題の変化</mark>地域コミュニティの活性化・・・管理講義棟建設に伴い公開講座等が充実し、地域の方に大学を訪れていただく機会が増え、まちづくりの担い手育成に寄与した。公開講座の開催だけにとらわれず、大学の地域貢献のありかたを検 討し、充実する必要がある。

今後のまちづくり の方策 (改善策を含む)

本地区は、中心市街地及びJR両毛線前橋駅に至近距離にありながら道路網の整備が遅れていたが、土地区画整理事業により狭小道路の改善や幹線道路の整備が進んでいる事、近隣公園が整備された事により安心して住み やすいまちづくりを推進している。今後も引き続き土地区画整理事業を推進し、幹線道路の整備完了を目指し、更なる利便性の向上に努める。また街区公園の整備等により、良好な住居環境の保全・育成を図る。
