

都市再生整備計画 事後評価シート  
六供・松並木地区

平成27年3月

群馬県前橋市

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	群馬県	市町村名	前橋市	地区名	六供・松並木地区			面積	481.3ha				
交付期間	平成21年度～平成25年度		事後評価実施時期	平成26年度		交付対象事業費	2,697百万円	国費率	40%				
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業	基幹事業	事業名 道路(江田天川大島線〔連結部〕、市道6-171号線)、公園(六供1号公園、六供2号公園、六供6号公園、松並木5号公園)、高質空間形成施設(広瀬川河畔道路) 土地区画整理事業(六供土地区画整理事業、松並木土地区画整理事業)										
		提案事業	地域創造支援事業(地域課題共同研究プロジェクト事業)										
	当初計画から削除した事業	基幹事業	公園(松並木5号公園)	削除/追加の理由			削除/追加による目標、指標、数値目標への影響						
		提案事業	—	—			—						
	新たに追加した事業	基幹事業	・道路(市道00-113号線) ・六供3号公園	—			—						
		提案事業	—	—			—						
交付期間の変更	当初	平成21年度～平成25年度	交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響			—							
変更	—	—	—			—							
2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標		単位	従前値	目標値	数値		目標	1年以内の	効果発現要因		フォローアップ	
				基準年度	目標年度	モニタリング	評価値	達成度	達成見込み	(総合所見)		予定時期	
	指標1	交通環境の改善度	%	40	H20	50	H25	56	○	あり なし	— —	土地区画整理事業等の進捗により、安全で安心して移動できる交通環境が整備され、地域内の回遊性が向上した。	—
	指標2	主要幹線道路の活用度	%	37	H20	45	H25	48	○	あり なし	— —	土地区画整理事業の進捗に伴い、主要幹線幹線緑林線の整備が進み、住民の利用頻度の向上と交通混雑の解消が図られた。	—
	指標3	消防活動困難度	%	44	H20	40	H25	39	○	あり なし	— —	土地区画整理事業の進捗に伴い、道路網が整備され交通障害等が改善し、快適で安全な住環境整備が図られた。	—
指標4	施設利用回数の増加	回	20 (24)	H20	30	H25	38	○	あり なし	— —	新たな利用団体等の出現が見られるなど、多目的ホールの積極的な活用が図られた結果、施設利用回数が増加した	—	
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		単位	従前値	目標値	数値		目標	1年以内の	効果発現要因		フォローアップ	
				基準年度	目標年度	モニタリング	評価値	達成度	達成見込み	(総合所見)		予定時期	
	その他の数値指標1												
	その他の数値指標2												
その他の数値指標3													
4)定性的な効果発現状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・広瀬川河畔道路及び公園整備により、周辺環境の改善と市民交流拠点を中心に回遊性の向上が図られた。</li> <li>・公園愛護会の設置により、市民のまちづくりへの参加の意欲が向上した。</li> <li>・区画整理事業により、交通障害や防災性の低さが解消され、良質な住環境の整備が図られた。</li> </ul>												
5)実施過程の評価	実施内容			実施状況			今後の対応方針等						
	モニタリング	目標達成に向けて確実な効果を上げるための市民アンケート等によるモニタリング調査		都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった			事業が順調に推移していたため、事業途中でのモニタリング調査を実施せず、事業終了後にアンケート調査等を実施し、事業効果を確認した。						
	住民参加プロセス	・街区公園(六供1号、2号、3号、6号)の整備 ・地域課題共同研究プロジェクト事業		都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった			● ● ● ・公園完成後は地元愛護会へ維持管理運営を移譲し、地元の主体的な活動にまかせ、市は後方支援に徹する。 ・今後も地域コミュニティの活性化や大学との連携強化を図っていく。						
	持続的なまちづくり体制の構築	公園愛護会の設置		都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった			● ● ● 公園愛護会に対する活動支援を継続していく。						

## 様式2-2 地区の概要

### 六供・松並木地区(群馬県前橋市) 都市再生整備計画事業の成果概要

まちづくりの目標	目標を定量化する指標	従前値	目標値	評価値	
大目標:『地域と人の基盤整備を図り、地域コミュニティの活性化と健全で安全な新しいまちづくり』 小目標1:居住性・防災性を向上させる“快適・安全な住環境の整備” 小目標2:地域生活基盤整備による“交通導線の創出と交通混雑の緩和” 小目標3:大学を中心とした“地域コミュニティの活性化と新たなまちづくりの担い手育成”	交通環境の改善度	単位: %	40 H20	50 H25	56 H26
	主要幹線道路の活用度	単位: %	37 H20	45 H25	48 H26
	消防活動困難度	単位: %	44 H20	40 H25	39 H25
	施設利用回数の増加	単位: 回	20 (24) H20	30 H25	38 H25


江田天川大島線(連結部)



六供1号公園



六供3号公園

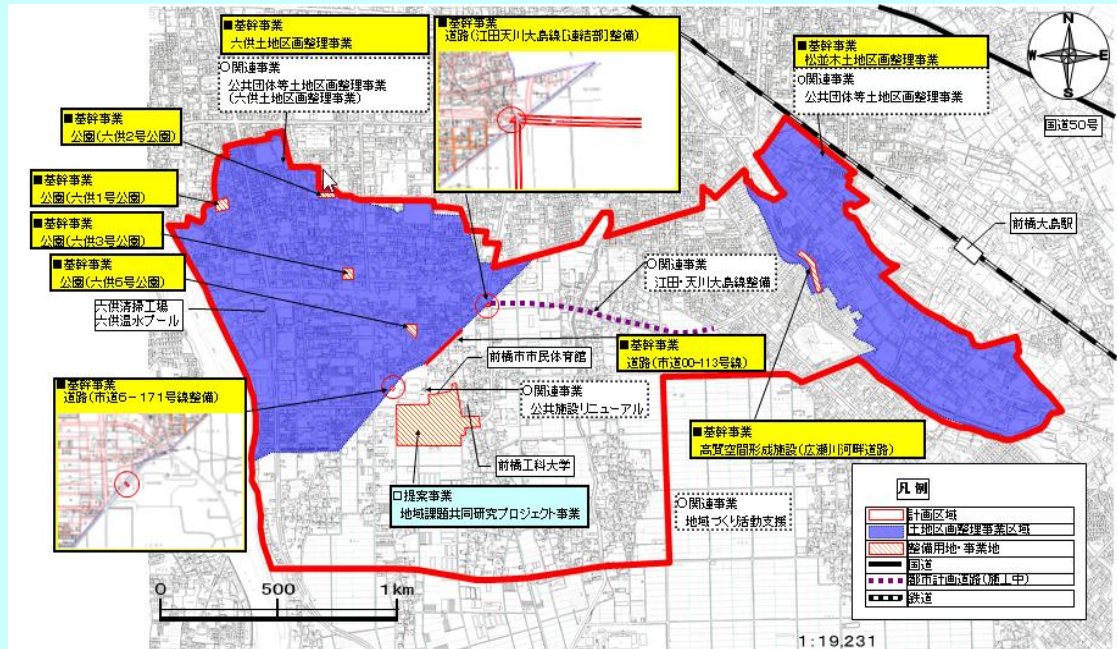

広瀬川河畔道路



六供土地区画整理事業



松並木土地区画整理事業



まちの課題の変化	<ul style="list-style-type: none"> <li>■土地区画整理事業により居住性や防災性が向上し、快適で安全な住環境の整備が図られた。また、広瀬川河畔道路や街区公園等の整備により、地域内の憩いの場並びに災害時の緊急避難場所となる空間が確保された。</li> <li>■市民農園の開設により、新たなコミュニティの場づくりと大学と地域との連携強化が図られた。また、大学にとってはプロジェクトを通じて学生を中心とした地域貢献と実践的な教育の場としての役割が果たせた。</li> <li>■(都)江田天川大島線と(主)前橋館林線の整備により、交通の利便性が向上するとともに、渋滞緩和の解消に繋がった。</li> </ul>
今後のまちづくりの方策(改善策を含む)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■地区内の快適で安全な住環境を維持するとともに、未整備箇所における公園事業を早期に実施していく。</li> <li>■大学と地元住民との連携強化を維持しながら、地区内の活性化、地域コミュニティ力を高め、住民協働のまちづくりを推進していく。</li> </ul>
